

# LUISA GUIDOTTI HOSPITAL


---

Relazione sullo stato di esecuzione del progetto: **“Maternity and Female Wards - Renovations”**

Presentato da: Dr Massimo Migani (LGH - Medical Superintendent)

18 Aprile 2015

*Progetto realizzato grazie al “Torneo Rimini 4 Mutoko” ed al sostegno del Gruppo “Gli Spappolati”*

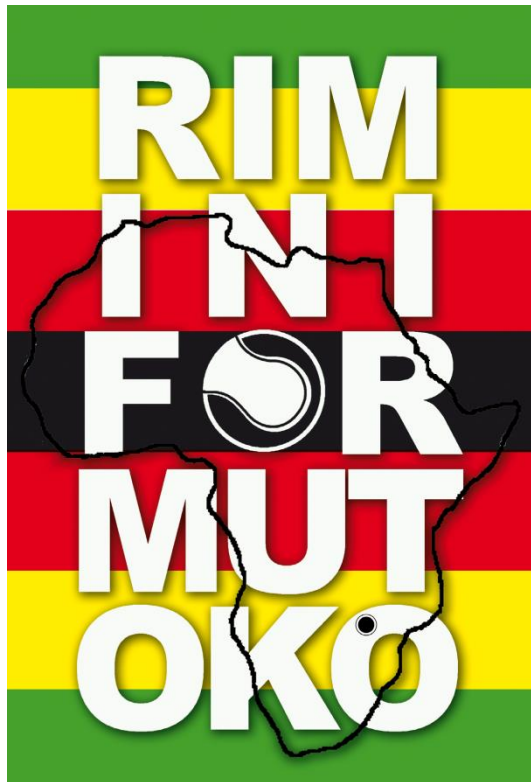

## **Ristrutturare ed adeguare ai correnti standard i reparti di Maternità e Medicina Donne del Luisa Guidotti Hospital e fornirli di attrezzature utili per il miglioramento del monitoraggio e trattamento dei pazienti.**

### **I Reparti di Maternità e Medicina donne del Luisa Guidotti Hospital.**

Il reparto di Maternità conta 23 posti letto per adulti, 2 incubatrici e 2 letti da parto. L'occupazione media è intorno ai 5 pz ammessi al giorno. Esso comprende stanze di degenza per terapia pre e post natale, sala travaglio e sala parto. Nel 2012 grazie a fondi stanziati dal Governo Tedesco attraverso la Conferenza Episcopale Zimbabweana, è stato possibile rinnovare interamente la sala parto che oggi si presenta ben attrezzata ed in linea con gli standard nazionali richiesti.

Il reparto di Medicina Donne conta 37 posti letto di cui 5 per la terapia post chirurgica. L'occupazione media è intorno ai 15 pz al giorno. Esso rappresenta uno dei reparti con i malati più critici. Le principali cause di ammissione sono: patologie secondarie all'infezione da HIV, malattie infettive (polmoniti, Tubercolosi, e malattie tropicali), cardiopatie.

I reparti sono stati costruiti negli anni 90' ed oggi si presenta la necessità di adeguare la struttura a nuovi standard nonché, dato il crescente numero di pazienti cardiopatici afferenti al Luisa Guidotti Hospital, per via del progetto Operazione Cuore (che ha portato negli anni al costante contatto con Medici Specialisti in Cardiologia), è sempre più frequente la presenza di pazienti cardiopatici ammessi in ospedale. Si rende pertanto necessaria un'adeguata capacità di monitoraggio dei parametri vitali e la dotazione del reparto con apparecchiature che permetta di migliorare la qualità dei servizi erogati.

### **Il Progetto di rinnovamento dei Reparti.**

I locali dei Reparti di Maternità e Medicina Donne non vengono rinnovati da diversi anni. La pavimentazione eseguita in passato, purtroppo ha ceduto ed oggi quasi tutte le stanze presentano mattonelle crepate, danneggiate o addirittura frantumate, il che crea notevole difficoltà nel mantenimento dell'igiene e nell'accoglienza dei locali.

Il progetto pertanto prevedeva:

- La ristrutturazione dei locali (pittura con vernice lavabile, piastrellamento delle stanze di accoglienza dei pazienti e dei corridoi principali con piastrelle ad elevata resistenza)

- La dotazione di nuovo mobilio sanitario per migliorare l'operatività e la qualità della degenza dei pazienti (divisori per letti della terapia intensiva e cardiologica), tavoli cardiologici per i pazienti
- L'adeguamento delle stanze di smaltimento/decontaminazione/disinfezione degli utensili per l'eliminazione di materiale organico proveniente dai degenti.
- La dotazione di apparecchiature (monitor dei parametri vitali, concentratori di ossigeno) per monitoraggio/intervento in particolare dei pazienti più critici.

OBIETTIVI STRATEGICI	ATTIVITA'	PERIODO ESECUZIONE	INDICATORI
1. Ristrutturazione/a adeguamento dei locali dei Reparti di Maternità e Medicina Donne	- Rifacimento della pavimentazione delle stanze di degenza e dei corridoi	- Febbraio 2014	Completato
	- Ristrutturazione/Adeguamento dei bagni	- Marzo 2014	- in esecuzione
	- Ristrutturazione/Adeguamento di stanze per lo smaltimento/disinfezione materiale organico proveniente dai degenti	- Marzo/Aprile 2014	
	- Ritinteggiatura dei locali del reparto	- Maggio/Giugno 2014	
2. Fornitura apparecchiature medicali per il miglioramento dei servizi sanitari elargiti	- Dotazione di 1 monitor paziente multiparametrico	- Luglio/Agosto 2014	- Completato
	- Dotazione di 2 concentratori di Ossigeno		

### Stato di avanzamento del progetto (Aprile 2015).

In seguito ad urgenze su altri settori e per poter garantire una fluente gestione dei progetti in corso che vi erano nel 2014, la Direzione Ospedaliera decise di slittamento la finalizzazione strutturale del progetto al 2015. Come riportato sopra, ad oggi è stato completato il rifacimento della pavimentazione dei reparti e la dotazione dell'equipaggiamento preventivato. Il progetto verrà poi completato in corso d'anno.

A seguire vengono presentate alcune fotografie dello stato di avanzamento dei lavori e rendiconto finanziario provvisorio.

## Stanze di degenza prima dell'intervento di ristrutturazione



## Reparto al termine della posa della nuova pavimentazione



## Rendiconto finanziario del Progetto (Aprile 2015).

### Fondi stanziati in seguito ad approvazione progetto.

Costi in Dollari USA (USD)	Numero	Valore	%	Quantità	Anno 2014
<b>Locali</b>					<b>LGH</b>
Ristrutturazione adeguamento locali	1	29.500	100%	1	29.500
Rinnovamento mobilio sanitario	1	4.000	100%	1	4.000
<b>Attrezzature</b>					<b>LGH</b>
Monitor paziente multiparametrico	1	2.000	100%	1	2.000
Concentratore di Ossigeno	3	1.500	100%	3	4.500
<b>Totale (USD)</b>					<b>40.000</b>

## I costi provvisori sostenuti per l'esecuzione del progetto

### DONAZIONI RICEVUTE PER FINANZIAMENTO PROGETTO (USD)

#### MATERINTY & FEMALE WARDS RENOVATIONS

USD 39.993 (\*)

(\*) Versamenti effettuati al netto di spese bancarie

AL 31/12/2014 risultavano spesi 8.004 USD (residui da stanziamento progetto 31.989 USD). Ad Aprile 2015 sono stati utilizzati fondi per un valore di 18.535,22 USD. Sono pertanto a disposizione 13.453,78 USD che verranno impiegati entro il 2015 per completare il progetto (dettagli nella tabella sottostante).

	Data	Valore (USD)
<b>Acquisto n. 4 concentratori Ossigeno</b>	Febbraio 2014	5.159
<b>Adeguamento rete elettrica reparti</b>	Luglio 2014	2.845
<b>Rifacimento Pavimentazione reparti</b>	Febbraio/Marzo 2015	18.535,22
<b>TOTALE (USD)</b>		<b>26.539,22</b>
<b>RESIDUO PER COMPLETAMENTO PROGETTO previsto entro il 2015</b>		<b>13.453,78</b>

Presentato da:

Dr. Massimo Migani (Direttore) .....



Il 18/04/2015
